

2019年10月

穂高広域施設組合新ごみ処理施設建設工事の進捗状況についてお知らせします。

施設全景


・北東より現場全景（10月末現在）



・工事状況（B工区 - 鉄骨建方10月中旬開始）



- 工事状況（鉄筋工事）
（B-1工区、4階躯体、配筋状況）

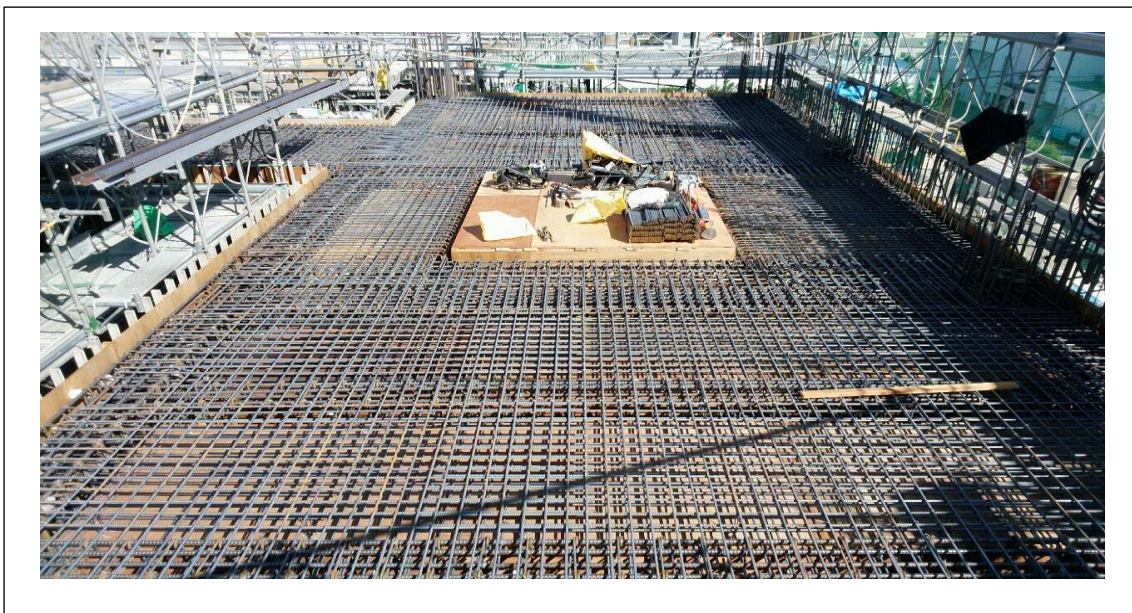

- 工事状況（鉄骨工事）
（E工区、灰クレーンガーダー取付完了）



- ・ 工事状況（鉄骨工事）
（G工区2階～3階）



- ・ 工事状況（外構工事）
（浸透貯留槽、碎石敷き込み状況）



建設工事スケジュール

年度	2018年度												2019年度												2020年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体工程	▼契約			建築工事着工▼									プラント工事着工▼									受電▼			ごみ受入開始▼						竣工▼					
実施設計	実施設計等																																			
準備・造成工事	準備工事																																			
建築工事													掘削・躯体・鉄骨工事																							
プラント工事																									機器据付・耐火物・配管・電気工事											
試運転																									試運転調整											

工区割図

