

2020年11月

穂高広域施設組合新ごみ処理施設建設工事の進捗状況についてお知らせします。

施設全景

( 南上空より現場全景 )



・工事状況 ( 外構工事 )

( 東側 アスファルト舗装施工状況 )



- ・工事状況（ 外構工事 ）  
（ あづみ野ランド連絡道 コンクリート打設状況 ）



- ・工事状況（ 外構工事 ）  
（ 来場者駐車場 ）



・工事状況

( プラットホーム全景 )



・工事状況

( ホップステージ 全景 )



- ・工事状況  
（ 5階 見学ホール ）



- ・工事状況  
（ ごみクレーン操作室 ）



・工事状況

( 建築完了検査 現地確認状況 )



・令和2年11月12日(木)に火入れ式を執り行いました。

( 穂高広域施設組合 新ごみ処理施設建設工事 火入れ式 )



- ・工事状況（ 試運転 ）  
（ 焼却炉 乾燥焚き開始 ）




- ・工事状況（ 試運転 ）  
（ 焼却炉 乾燥焚き完了 ）



- ・工事状況（ 試運転 ）  
（ ごみ収集車走行テスト状況 ）



- ・工事状況（ 試運転 ）  
（ ごみ受入開始 ）

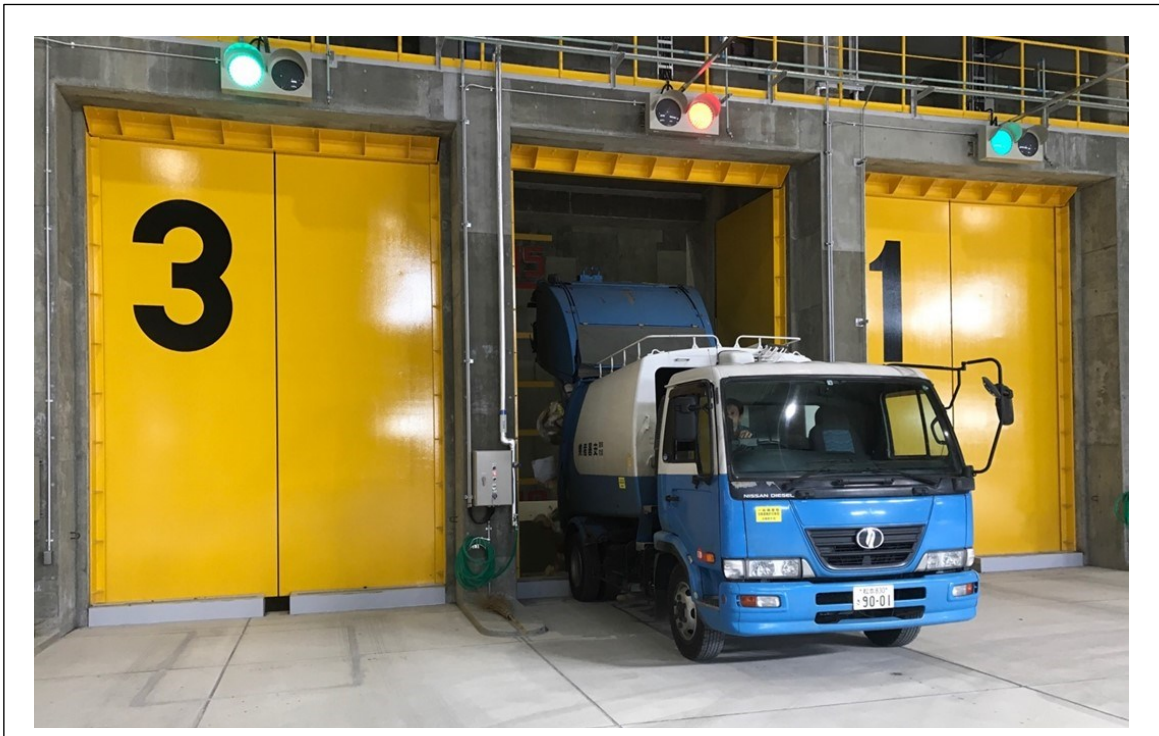

## 建設工事スケジュール

年度	2018年度												2019年度												2020年度											
月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体工程	▼契約			建築工事着工▼									プラント工事着工▼									受電▼			ごみ受入開始▼						竣工▼					
実施設計	実施設計等																																			
準備工事	準備工事																																			
建築工事													掘削・躯体・造成・鉄骨・外構・植栽工事																							
プラント工事																									機器据付・耐火物・配管・電気・仕上げ工事											
試運転																									試運転調整											

## 工区割図

